

# Neubau Chisenbrücke Bernstrasse Hochwasserschutz Bachmätteli Kiesen

**Orientierungsveranstaltung  
vom 20. Januar 2020**



# Programm


1. Begrüssung, Einleitung
2. Projektanpassungen
3. Bauvorgang
4. Termine / Erschwernisse
5. Fragen / Diskussion

# Projektanpassungen

## Auslöser:

- Unternehmervariante Wasserhaltung  
→ Umleitungsgerinne
- Erschütterungen Rammversuch  
→ Rühlwand

# Projektanpassungen

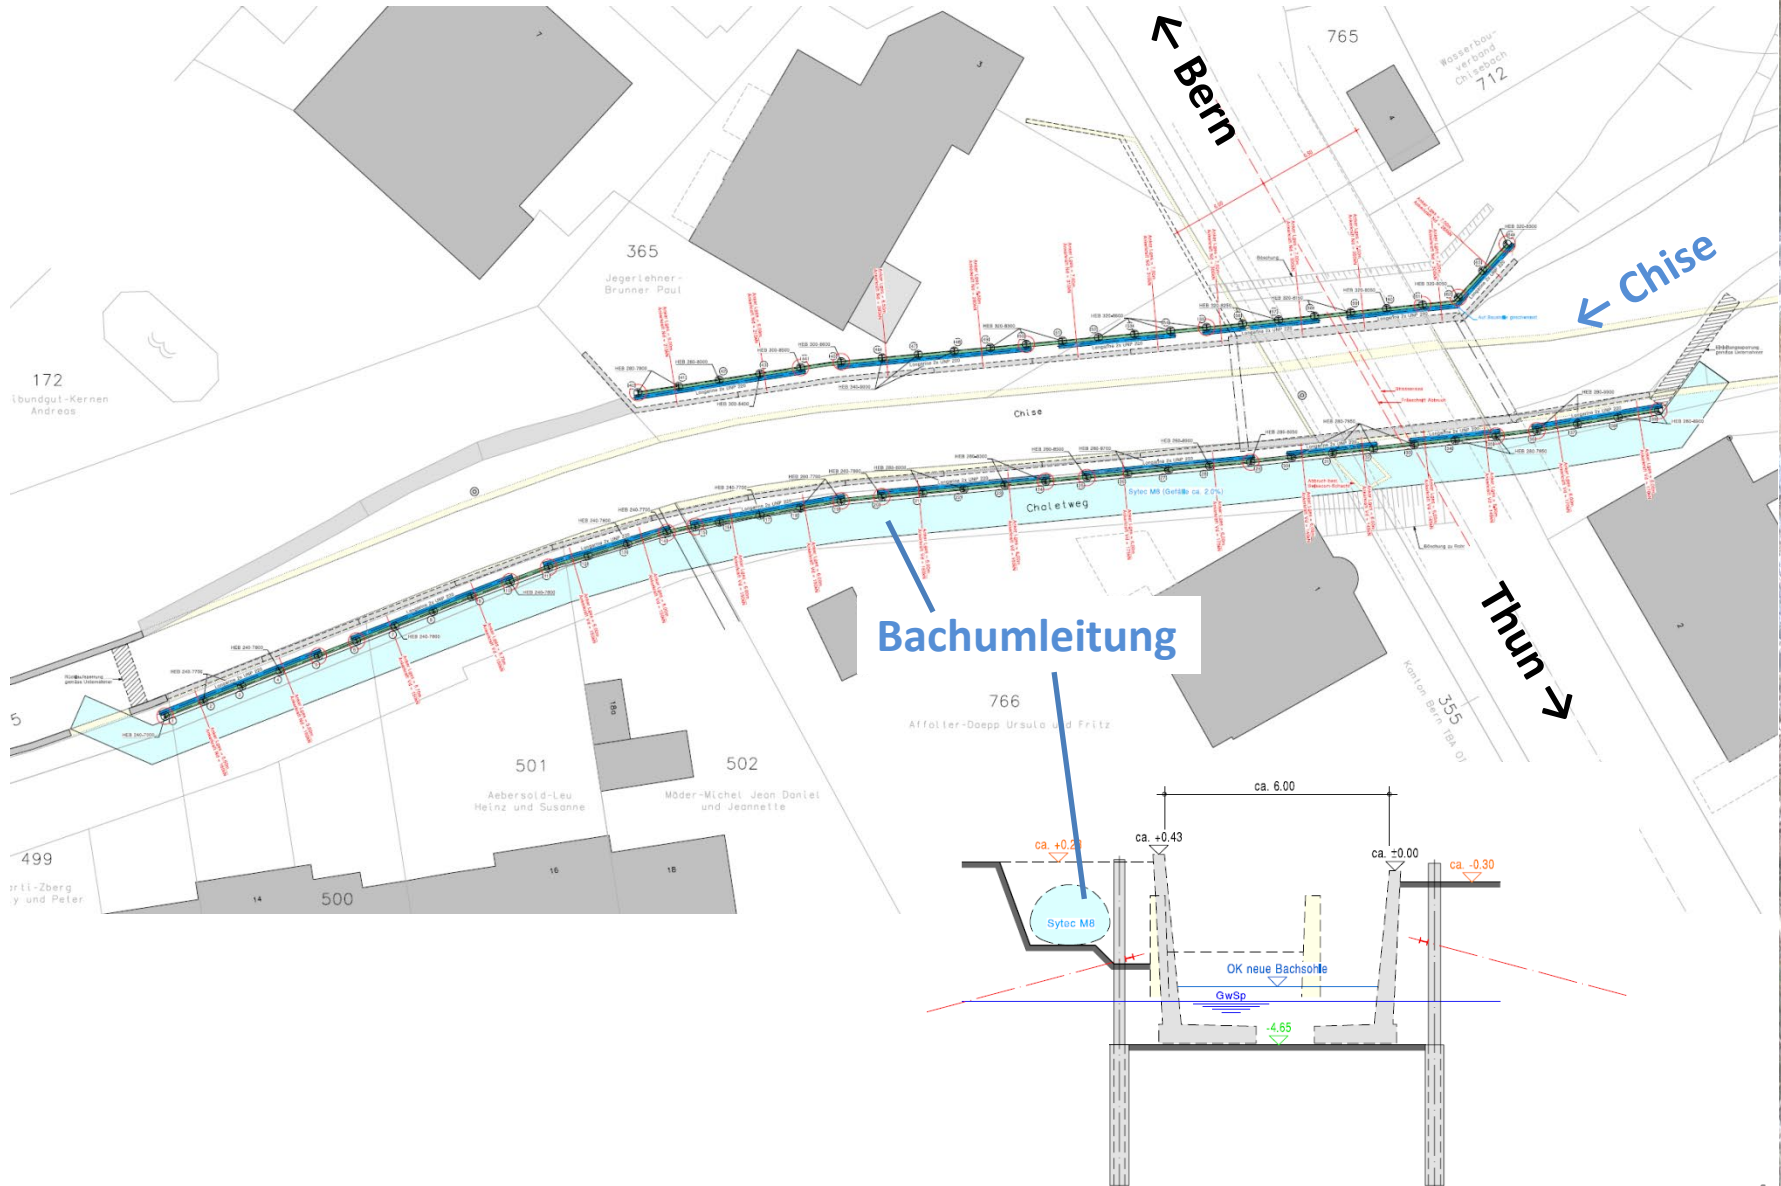


# Projektanpassungen

## Wasserhaltung / Bachumleitung

- Dimensioniert für Risikowassermenge  
→ 7 m<sup>3</sup>/s
- Bei Hochwasser wird Baustelle geflutet  
→ kein zusätzliches Risiko für Bevölkerung
- Bachumleitung wird überdeckt  
→ Chaletweg: für Durchgang gesperrt (ab Trafo)  
Zugang für Bernstrasse 1 möglich



# Bauvorgang

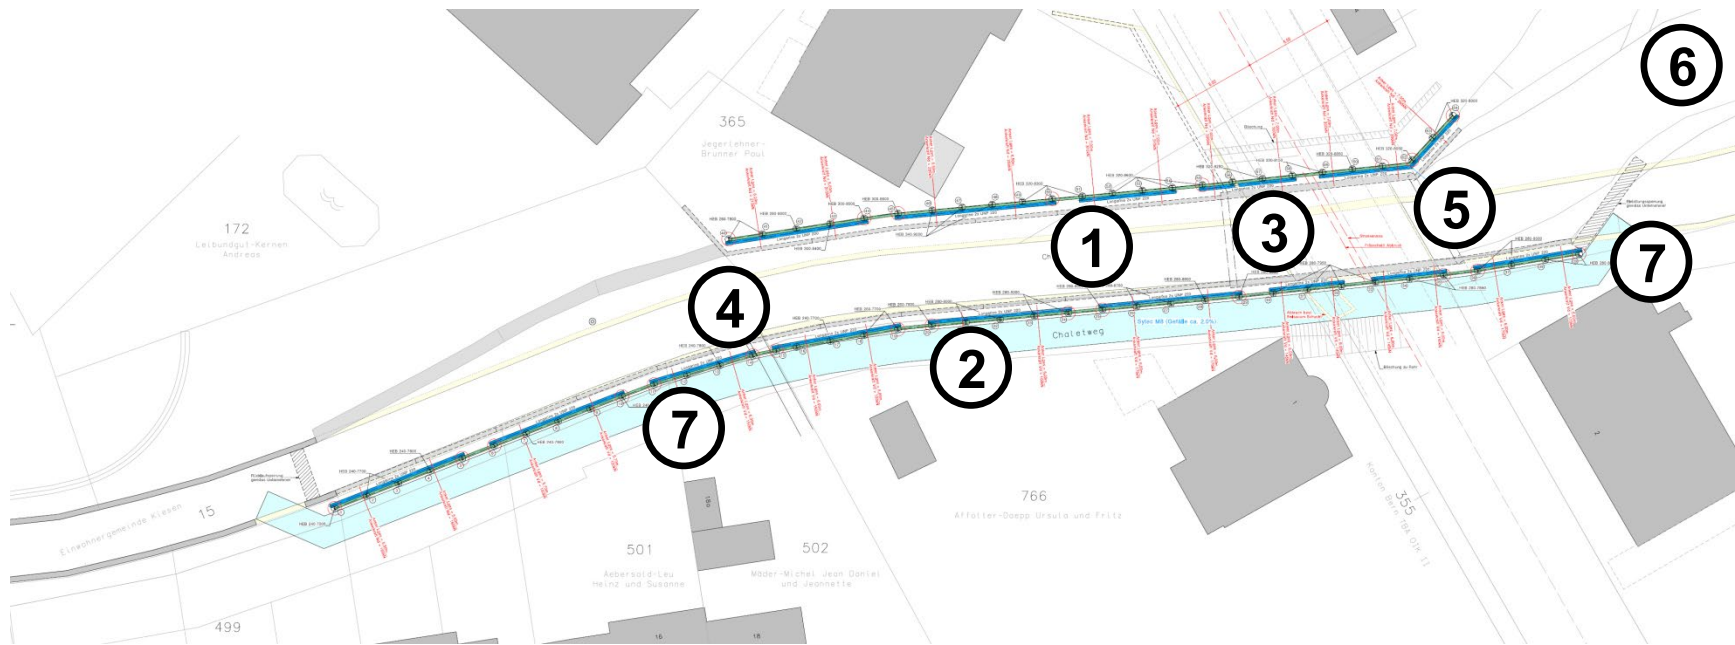


- Erstellung Rühlwände ① und Bachumleitung ②
- Abbruch / Neubau Brücke Westseite ③
- Abbruch / Aushub / Neubau Stützmauern Westseite ④
- Abbruch / Neubau Brücke Ostseite + Stützmauern ⑤
- Revitalisierung Bachmätteli ⑥
- Rückbau Bachumleitung und Wiederherstellung Chalet- u. Töpfereiweg ⑦

## Termine (Erschwernisse für Anwohner)

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Erstellung Rühlwand <b>Chaletweg</b>                                 | 13. – 21. Januar 2020                    |
| Erstellung Bachumleitung <b>Chaletweg</b>                            | 22. Januar – 11. Februar 2020            |
| Erstellung Rühlwand <b>Töpfereiweg</b>                               | 29. Januar – 3. Februar 2020             |
| Vollsperrung <b>Bernstrasse</b>                                      | 4. – 6. Februar 2020, jeweils 8 – 16 Uhr |
| Erstellung Bachumleitung <b>Töpfereiweg</b>                          | 12. – 18. Februar 2020                   |
| Werkverkehr Chaletweg<br>(Abbruch / Aushub / Stützmauern)            | Februar – Juli 2020                      |
| Ampelbetrieb / 1-spurige Verkehrsführung                             | bis ca. anfangs August 2020              |
| Rückbau Baustellenkran                                               | anfangs August 2020                      |
| Rückbau Bachumleitung und<br>Wiederherstellung Chaletweg/Töpfereiweg | Mitte August bis Oktober 2020            |


Terminverschiebungen aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen oder Unvorhergesehenem sind möglich.

# Termine (Erschwernisse für Anwohner)

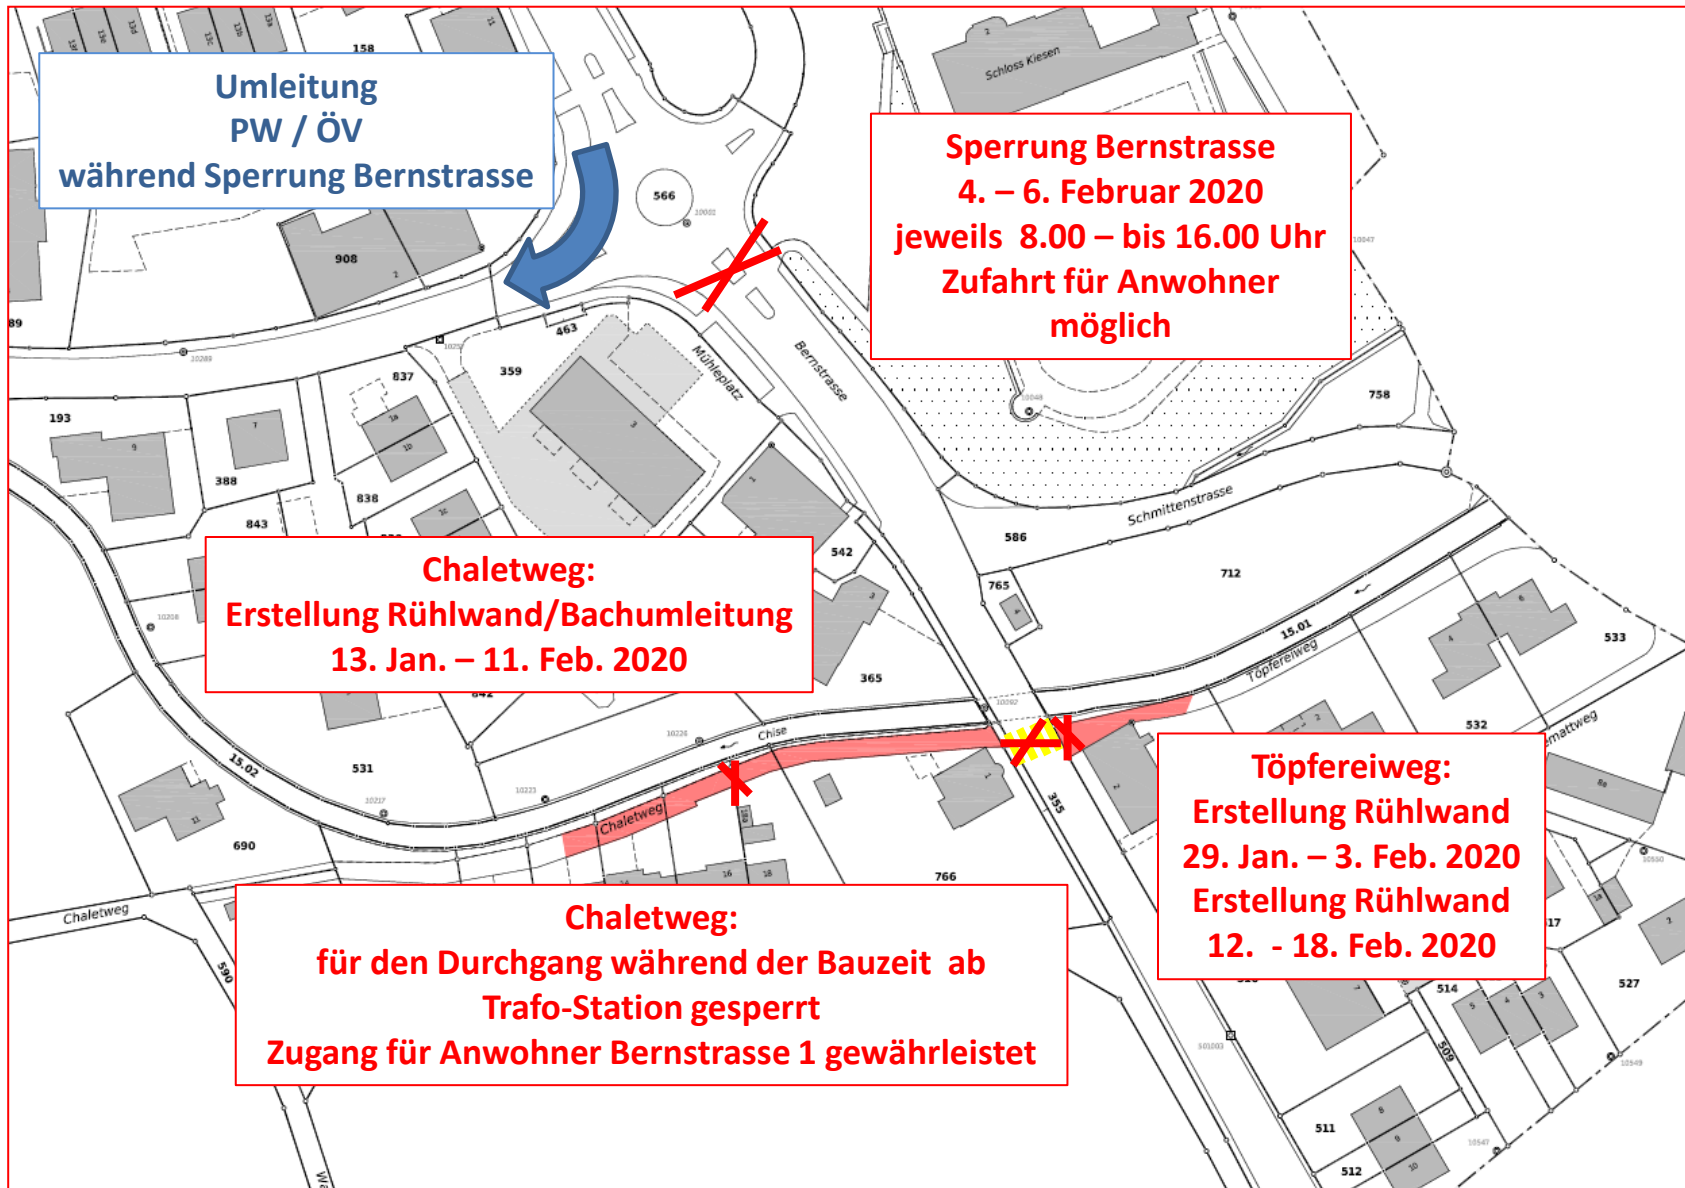



# Umleitungskonzept Verkehrssperrung

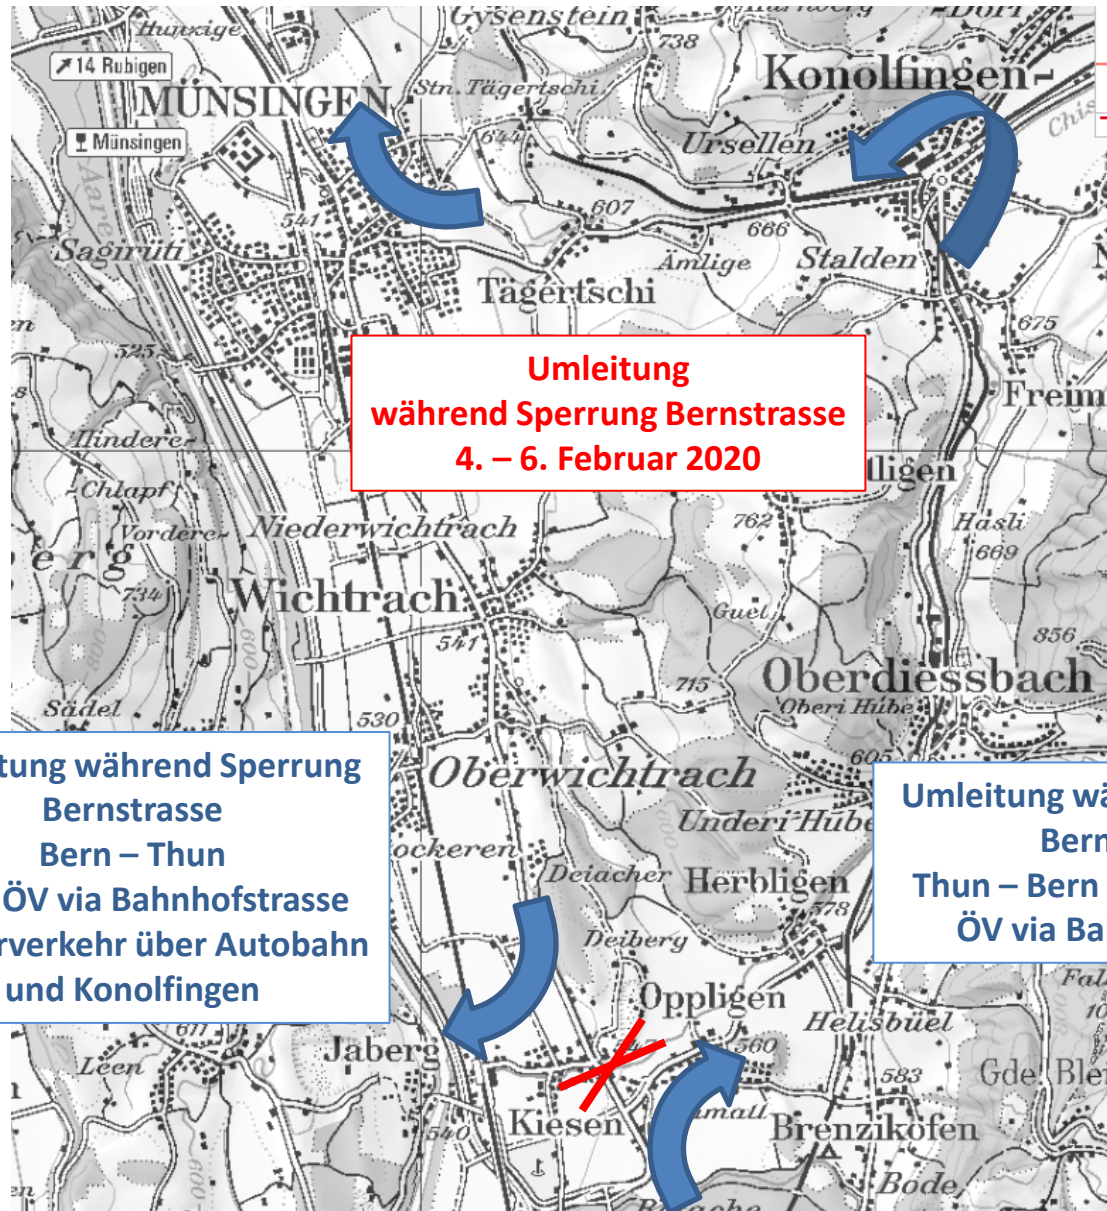

# Fragen





# Dank

